




UFSB Universidade Federal
do Sul da Bahia

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

BREVE HISTÓRICO

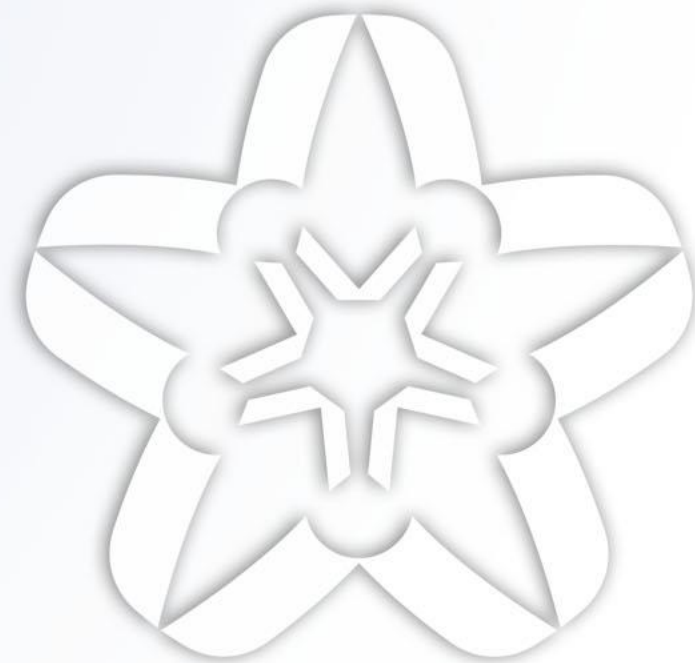



HISTÓRICO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO

- **1ª FASE: CRIAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO**


PERÍODO: AGOSTO DE 2016

Reuniões entre Prof. Francisco Mesquita, Cleidinéia Andrade, Franklin Matos, Jeane Almeida.

PERÍODO: SETEMBRO DE 2016

Após elaborado o plano, foi submetido a apreciação do reitor que convocou uma comissão central para execução.

A comissão tinha por objetivo concluir o projeto em 120 dias

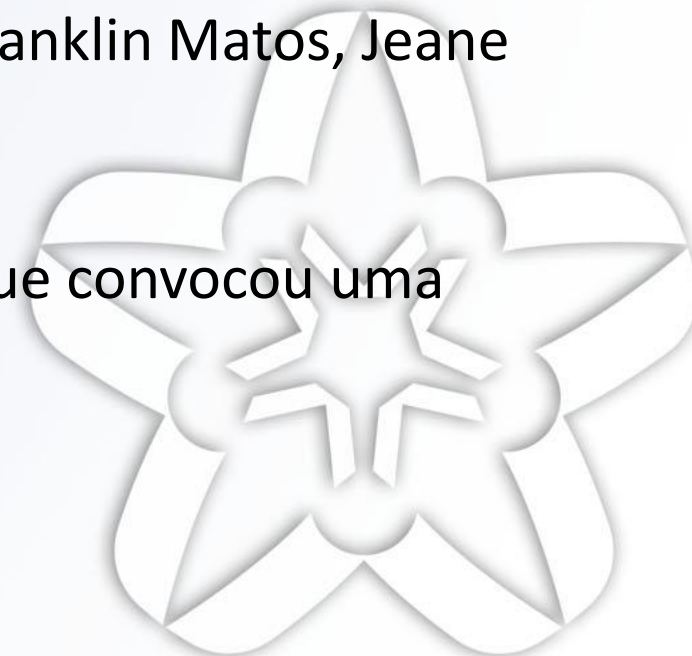



PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016

REALIZAÇÕES DA COMISSÃO:

- Criou o projeto do Forum para o PDI
- Criou o Site do PDI
- Construiu um calendário para elaboração
- Iniciou a escrita da parte técnica do plano

FATOR IMPEDITIVO DE CONCLUSÃO

- NOVEMBRO DE 2016: GREVE DOS SERVIDORES E CONSEQUENTE ADIAMENTO DO FÓRUM.






- **2ª FASE: ADEQUAÇÃO DO PROJETO INICIAL**

Período: Junho de 2017

Responsável: Diretoria de Planejamento

- Decide-se pela utilização da Análise Swot
- Reunião de toda a documentação da 1ª etapa e abertura e organização do processo no Sipac

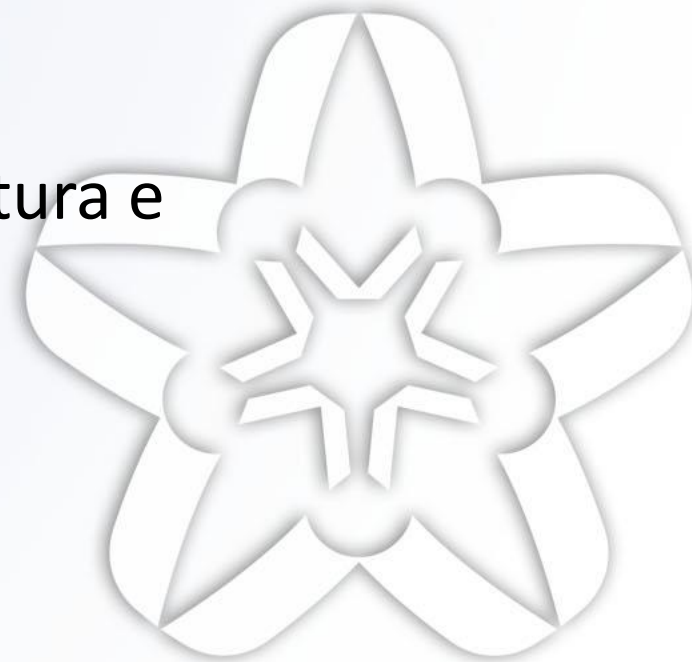



- **3ª FASE: CONSTRUÇÃO DA ANALISE SWOT**


Período: Agosto a Outubro de 2017

Reuniões com setores em cada campi e CUNI:

- Estudantes (3 campi, Cunis)
- Técnicos Administrativos (Reitoria, Pró reitoria e Campi)
- Docentes (IHACs e Centros de Formação)

Produto: Registro das impressões acerca da Instituição

Comprovação: Fotos, Áudios, Listas de Presença e Anotações

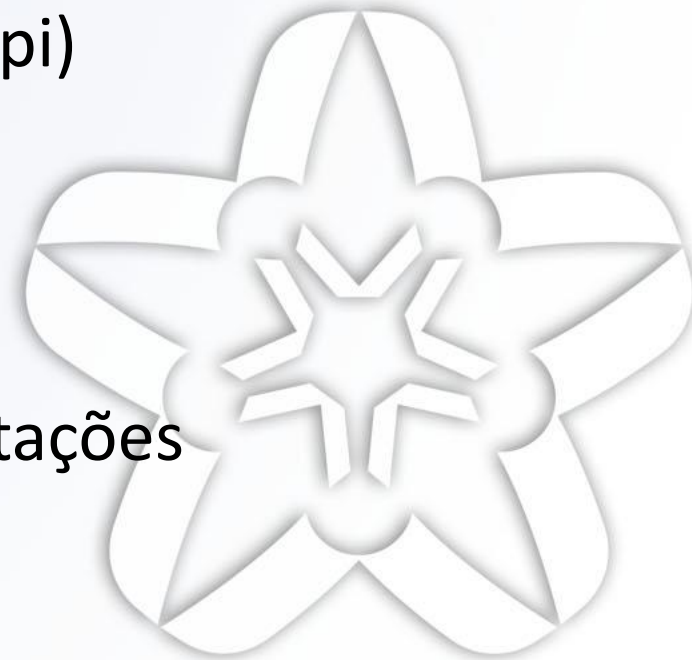




- **3ª FASE: CONSTRUÇÃO DA ANALISE SWOT**

Período: Novembro e Dezembro de 2017

- Recuperação do site
- Abertura e divulgação do Site para a comunidade
- Realização de pesquisa através questionário para contemplar a comunidade que não pôde comparecer as reuniões.

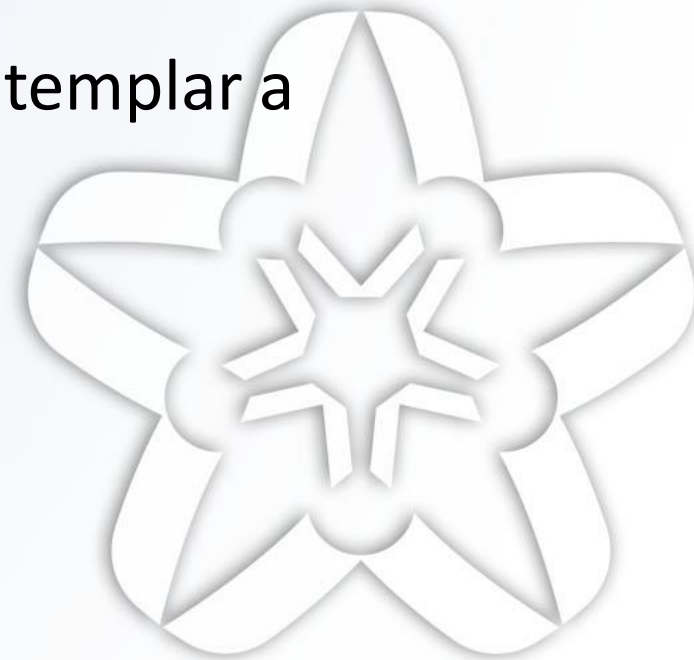




- **3ª FASE: CONSTRUÇÃO DA ANÁLISE SWOT e ADEQUAÇÃO AO FORPDI**

Período: Janeiro e Fevereiro de 2018

- Compilam-se os dados dessas pesquisas e diálogos através da análise SWOT, demonstrando um mapa estratégico dos anseios da comunidade.
- Estudo de viabilidade de inserção do documento nos moldes do FORPDI

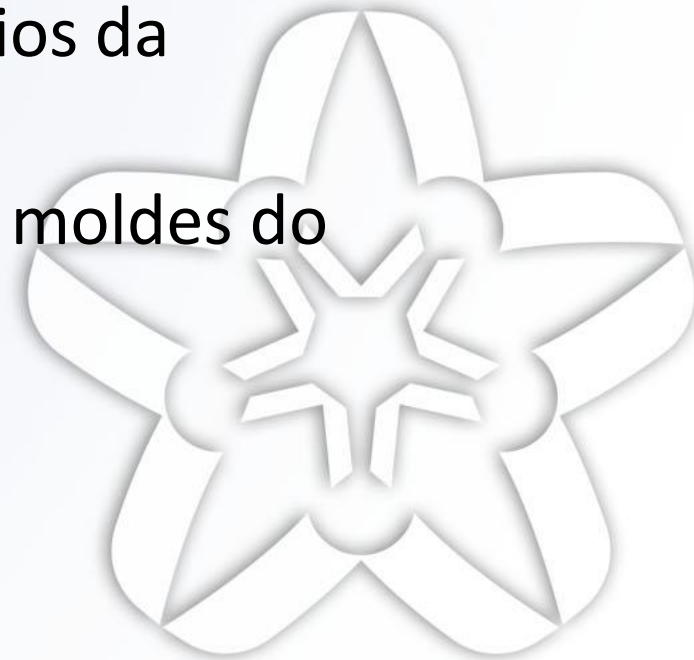




- **4ª FASE: REESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO**

Período: Março a Maio de 2018

Inserção dos moldes do FORPDI (necessidade de readaptar o plano para cumprir algumas requisitos mínimos para aprovação do texto no ministério)

Período: Maio a Dezembro de 2018

As Pró Reitorias e algumas Diretorias reescrevem algumas partes do plano no que diz respeito aos conceitos para que se adeque ao FORPDI

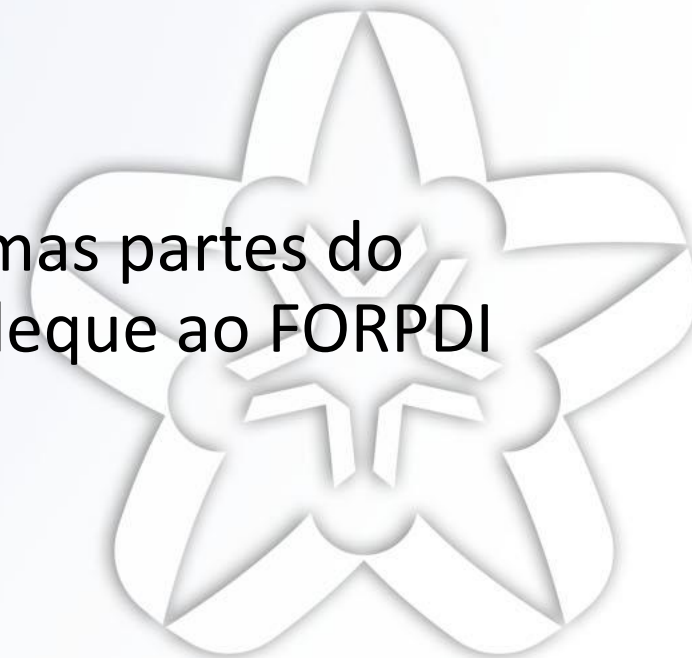




- **5ª FASE: REDEFININDO METAS E ADEQUANDO TEXTO**

Período: Janeiro a Junho de 2019

- As Pró-Reitorias constituem o Anexo de Metas, Objetivos e Indicadores devidamente linkados com a análise SWOT

Período: Julho a Novembro de 2019

- O documento sofre alterações, com especial foco nas metas e indicadores devido ao contingenciamento reduzindo as expectativas.
- Inserção do Projeto Pedagógico Institucional no PDI, finalizando a o corpo principal do texto

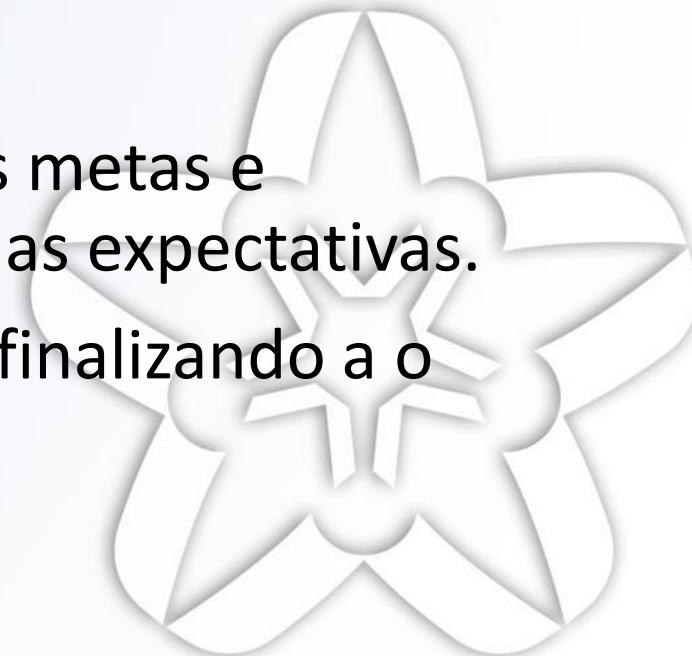



- **6ª FASE: REDEFININDO METAS E ADEQUANDO TEXTO**

Período: Dezembro de 2019 a Fevereiro de 2020

- Reenvio as Pró Reitorias para adequação dos texto e metas para compreender o período de 2020-2024

Período: Março e Abril de 2020

- Revisão completa do texto e do Anexo. Preparação para envio aos decanos iniciarem a discussão com a comunidade

